

Lavori di "Sistemazione campo calcetto esistente e impianto di illuminazione"

COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

COMMITTENTE:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Sindaco: Avv. Marcella Chirra

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Geom. Angelo Demetrio Cherchi

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



AII. I

**Cronoprogramma dei
lavori**

DATA: 11/08/2020

PROGETTISTA:
dott. arch. Patrizio Avellino

Via C. Colombo 90 – 09089 Bosa (OR)
tel. 0785 377050 e-mail: studioarcav@tiscali.it

VISTO DELL'ENTE:

Comune di LEI
Provincia di NUORO

OGGETTO: Lavori di “Sistemazione del campo calcetto e realizzazione dell’impianto d’illuminazione

C.I.G.: Z1C2B593BB

COMMITTENTE: COMUNE DI LEI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16- Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 69.481,36
Oneri della sicurezza	€ 1.750,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.768,64
Costo complessivo dell'opera	€ 95.000,00

LEI, li 05/08/2020

Il Progettista:
ARCHITETTO PATRIZIO AVELLINO

ID	Nome	Durata 30,00 g - (42 g)	Inizio	Fine	28 set 20							05 ott 20							12 ott 20							19 ott 20							26 ott 20							02 nov 20							09 nov 20						
					m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d	l	m	g	v	s	d								
1	A002 - Operazione di rattoppi e bonifica dell...zata del	2,00	mer 07/10/20	gio 08/10/20																																																	
2	1 - ripristino pavimentazione	2,00	mer 07/10/20	gio 08/10/20																																																	
3	A005 - Operazione di ripristino dello porte d...re il	2,00	mar 10/11/20	mer 11/11/20																																																	
4	1 - ripristino pavimentazione	2,00	mar 10/11/20	mer 11/11/20																																																	
5	A001 - Operazione propedeutiche all'avvio del... a	3,00	gio 01/10/20	lun 05/10/20																																																	
6	1 - ripristino pavimentazione	3,00	gio 01/10/20	lun 05/10/20																																																	
7	A04 - Fornitura e posa di manto in erba arti...ere	4,00	mer 04/11/20	lun 09/11/20																																																	
8	1 - ripristino pavimentazione	4,00	mer 04/11/20	lun 09/11/20																																																	
9	os - Oneri della sicurezza	30,00	gio 01/10/20	mer 11/11/20																																																	
10	3 - Oneri della sicurezza	30,00	gio 01/10/20	mer 11/11/20																																																	
11	SAR19_PF.0001.0002.0021 - SCAVO A SEZIONE	2,00	mar 06/10/20	mer 07/10/20																																																	
12	2 - impianto illuminazione	2,00	mar 06/10/20	mer 07/10/20																																																	
13	SAR19_PF.0001.0002.0038 - RINTERRO DI CAVI A	1,00	mar 20/10/20	mar 20/10/20																																																	
14	2 - impianto illuminazione	1,00	mar 20/10/20	mar 20/10/20																																																	
15	SAR19_PF.0001.0002.0083 - STRATO DI	3,00	lun 19/10/20	mer 21/10/20																																																	
16	1 - ripristino pavimentazione	3,00	lun 19/10/20	mer 21/10/20																																																	
17	A112 - FFornitura e posa in opera di palo in ...ata. (rif.	3,00	mer 28/10/20	ven 30/10/20																																																	
18	2 - impianto illuminazione	3,00	mer 28/10/20	ven 30/10/20																																																	
19	A115 - Fornitura e posa in opera di proiettor...l	2,00	lun 02/11/20	mar 03/11/20																																																	
20	2 - impianto illuminazione	2,00	lun 02/11/20	mar 03/11/20																																																	
21	SAR19_PF.0003.0015.0001 - POZZETTO	2,00	gio 08/10/20	ven 09/10/20																																																	
22	2 - impianto illuminazione	2,00	gio 08/10/20	ven 09/10/20																																																	
23	SAR19_PF.0004.0001.0006 - Calcestruzzo a	2,00	mer 21/10/20	gio 22/10/20																																																	
24	2 - impianto illuminazione	2,00	mer 21/10/20	gio 22/10/20																																																	
25	SAR19_PF.0009.0001.0018 - FORNITURA E POSA	2,00	gio 15/10/20	ven 16/10/20																																																	
26	2 - impianto illuminazione	2,00	gio 15/10/20	ven 16/10/20																																																	
27	SAR19_PF.0001.0001.0016 - DEMOLIZIONE E	3,00	mer 07/10/20	ven 09/10/20																																																	
28	2 - impianto illuminazione	3,00	mer 07/10/20	ven 09/10/20																																																	
29	SAR19_PF.0004.0001.0009 - Calcestruzzo a	2,00	gio 15/10/20	ven 16/10/20																																																	
30	2 - impianto illuminazione	2,00	gio 15/10/20	ven 16/10/20																																																	
31	SAR19_PF.0004.0001.0043 - Maggiorazione del	2,00	gio 15/10/20	ven 16/10/20																																																	
32	2 - impianto illuminazione	2,00	gio 15/10/20	ven 16/10/20																																																	
33	SAR19_PF.0008.0001.0001 - CASSEFORME in	2,00	mar 13/10/20	mer 14/10/20																																																	
34	2 - impianto illuminazione	2,00	mar 13/10/20	mer 14/10/20																																																	
35	SAR19_PF.0008.0002.0002 - ACCIAIO PER	2,00	gio 08/10/20	ven 09/10/20																																																	
36	2 - impianto illuminazione	2,00	gio 08/10/20	ven 09/10/20																																																	

Comune di LEI
Provincia di NUORO

OGGETTO: Lavori di “Sistemazione del campo calcetto e realizzazione dell’impianto d’illuminazione

C.I.G.: Z1C2B593BB

COMMITTENTE: COMUNE DI LEI

PROGRAMMA DEI LAVORI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 69.481,36
Oneri della sicurezza	€ 1.750,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.768,64
Costo complessivo dell'opera	€ 95.000,00

LEI, li 05/08/2020

Il Progettista:
ARCHITETTO PATRIZIO AVELLINO

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 01/10/2020 a 29/10/2020	da 30/10/2020 a 04/11/2020	da 05/11/2020 a 06/11/2020	da 07/11/2020 a 11/11/2020		
A002 - Operazione di rattoppi e bonifica dell...zata del materiale asportato e rimosso;							
	€ 806,45	€ 806,45					
1 - ripristino pavimentazione	(€ 806,45)	(€ 806,45)					
A005 - Operazione di ripristino dello porte d...re il ripristino delle porte esistenti							
	€ 266,77				€ 266,77		
1 - ripristino pavimentazione	(€ 266,77)				(€ 266,77)		
A001 - Operazione propedeutiche all'avvio del... a tutte le opere previste in progetto.							
	€ 1.322,51	€ 1.322,51					
1 - ripristino pavimentazione	(€ 1.322,51)	(€ 1.322,51)					
A04 - Fornitura e posa di manto in erba arti...ere previsto nel capitolato d'appalto.							
	€ 40.279,67		€ 10.069,92	€ 20.139,84	€ 10.069,91		
1 - ripristino pavimentazione	(€ 40.279,67)		(€ 10.069,92)	(€ 20.139,84)	(€ 10.069,91)		
os - Oneri della sicurezza	€ 1.750,00	€ 1.225,00	€ 233,33	€ 116,67	€ 175,00		
3 - Oneri della sicurezza	(€ 1.750,00)	(€ 1.225,00)	(€ 233,33)	(€ 116,67)	(€ 175,00)		
SAR19_PF.0001.0002.0021 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA ...o schiacciamento inferiore a 120 kg/cm ²							
	€ 410,64	€ 410,64					
2 - impianto illuminazione	(€ 410,64)	(€ 410,64)					
SAR19_PF.0001.0002.0038 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RIS...scavi eseguiti nell'ambito del cantiere							
	€ 55,84	€ 55,84					
2 - impianto illuminazione	(€ 55,84)	(€ 55,84)					
A Riportare:		€ 3.820,44	€ 10.303,25	€ 20.256,51	€ 10.511,68		

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 01/10/2020 a 29/10/2020	da 30/10/2020 a 04/11/2020	da 05/11/2020 a 06/11/2020	da 07/11/2020 a 11/11/2020		
Riporto:		€ 3.820,44	€ 10.303,25	€ 20.256,51	€ 10.511,68		
SAR19_PF.0001.0002.0083 - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTAT...fici scolastici e fabbricati in genere.	€ 3.913,24	€ 3.913,24					
1 - ripristino pavimentazione	(€ 3.913,24)	(€ 3.913,24)					
A112 - FFornitura e posa in opera di palo in ...ata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq							
2 - impianto illuminazione	€ 6.857,58	€ 4.571,72	€ 2.285,86				
	(€ 6.857,58)	(€ 4.571,72)	(€ 2.285,86)				
A115 - Fornitura e posa in opera di proiettor...l manuale d'uso e ogni onere compreso.							
2 - impianto illuminazione	€ 9.087,84		€ 9.087,84				
	(€ 9.087,84)		(€ 9.087,84)				
SAR19_PF.0003.0015.0001 - POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo...sioni della copertina 40x40xHmin=4/5 cm	€ 1.157,28	€ 1.157,28					
2 - impianto illuminazione	(€ 1.157,28)	(€ 1.157,28)					
SAR19_PF.0004.0001.0006 - Calcestruzzo a durabilità garantita pe...e di esposizione X0 norma UNI EN 206-1.	€ 940,80	€ 940,80					
2 - impianto illuminazione	(€ 940,80)	(€ 940,80)					
SAR19_PF.0009.0001.0018 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN P...infianchi ed al rinterro del cavidotto.	€ 400,82	€ 400,82					
A Riportare:		€ 14.804,30	€ 21.676,95	€ 20.256,51	€ 10.511,68		

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 01/10/2020 a 29/10/2020	da 30/10/2020 a 04/11/2020	da 05/11/2020 a 06/11/2020	da 07/11/2020 a 11/11/2020		
Riporto:		€ 14.804,30	€ 21.676,95	€ 20.256,51	€ 10.511,68		
2 - impianto illuminazione	(€ 400,82)	(€ 400,82)					
SAR19_PF.0001.0001.0016 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI...autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm	€ 644,49	€ 644,49					
2 - impianto illuminazione	(€ 644,49)	(€ 644,49)					
SAR19_PF.0004.0001.0009 - Calcestruzzo a durabilità garantita pe...posizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.	€ 1.685,01	€ 1.685,01					
2 - impianto illuminazione	(€ 1.685,01)	(€ 1.685,01)					
SAR19_PF.0004.0001.0043 - Maggiorazione del prezzo del calcestru...getti ed escluse le armature metalliche	€ 116,26	€ 116,26					
2 - impianto illuminazione	(€ 116,26)	(€ 116,26)					
SAR19_PF.0008.0001.0001 - CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto	€ 838,94	€ 838,94					
2 - impianto illuminazione	(€ 838,94)	(€ 838,94)					
SAR19_PF.0008.0002.0002 - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN C..., con impiego di barre fino al FI 12-14	€ 697,22	€ 697,22					
2 - impianto illuminazione	(€ 697,22)	(€ 697,22)					
IMPORTO		€ 18.786,22	€ 21.676,95	€ 20.256,51	€ 10.511,68		
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 18.786,22	€ 40.463,17	€ 60.719,68	€ 71.231,36		
%		26,37%	30,43%	28,44%	14,76%		
% PROGRESSIVA		26,37%	56,81%	85,24%	100,00%		

Comune di LEI
Provincia di NUORO

OGGETTO: Lavori di “Sistemazione del campo calcetto e realizzazione dell’impianto d’illuminazione

C.I.G.: Z1C2B593BB

COMMITTENTE: COMUNE DI LEI

PROGRAMMAZIONE S.A.L.

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 69.481,36
Oneri della sicurezza	€ 1.750,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.768,64
Costo complessivo dell'opera	€ 95.000,00

LEI, li 05/08/2020

Il Progettista:
ARCHITETTO PATRIZIO AVELLINO

PROGRAMMA S.A.L.

DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	Inizio lavori
	21	21	€ 18.786,20	€ 18.786,20	26,37%	Si
	25	4	€ 40.463,15	€ 21.676,95	56,81%	Si
	27	2	€ 60.719,65	€ 20.256,50	85,24%	Si
	30	3	€ 71.231,36	€ 10.511,71	100,00%	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 42 (quarantadue) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Comune di LEI
Provincia di NUORO

OGGETTO: Lavori di “Sistemazione del campo calcetto e realizzazione dell’impianto d’illuminazione

C.I.G.: Z1C2B593BB

COMMITTENTE: COMUNE DI LEI


DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

(Art. 23, comma 7 e 8 del D.P.R. 50/16 - Art. 40 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 69.481,36
Oneri della sicurezza	€ 1.750,00
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 23.768,64
Costo complessivo dell'opera	€ 95.000,00

LEI, li 05/08/2020

Il Progettista:
ARCHITETTO PATRIZIO AVELLINO

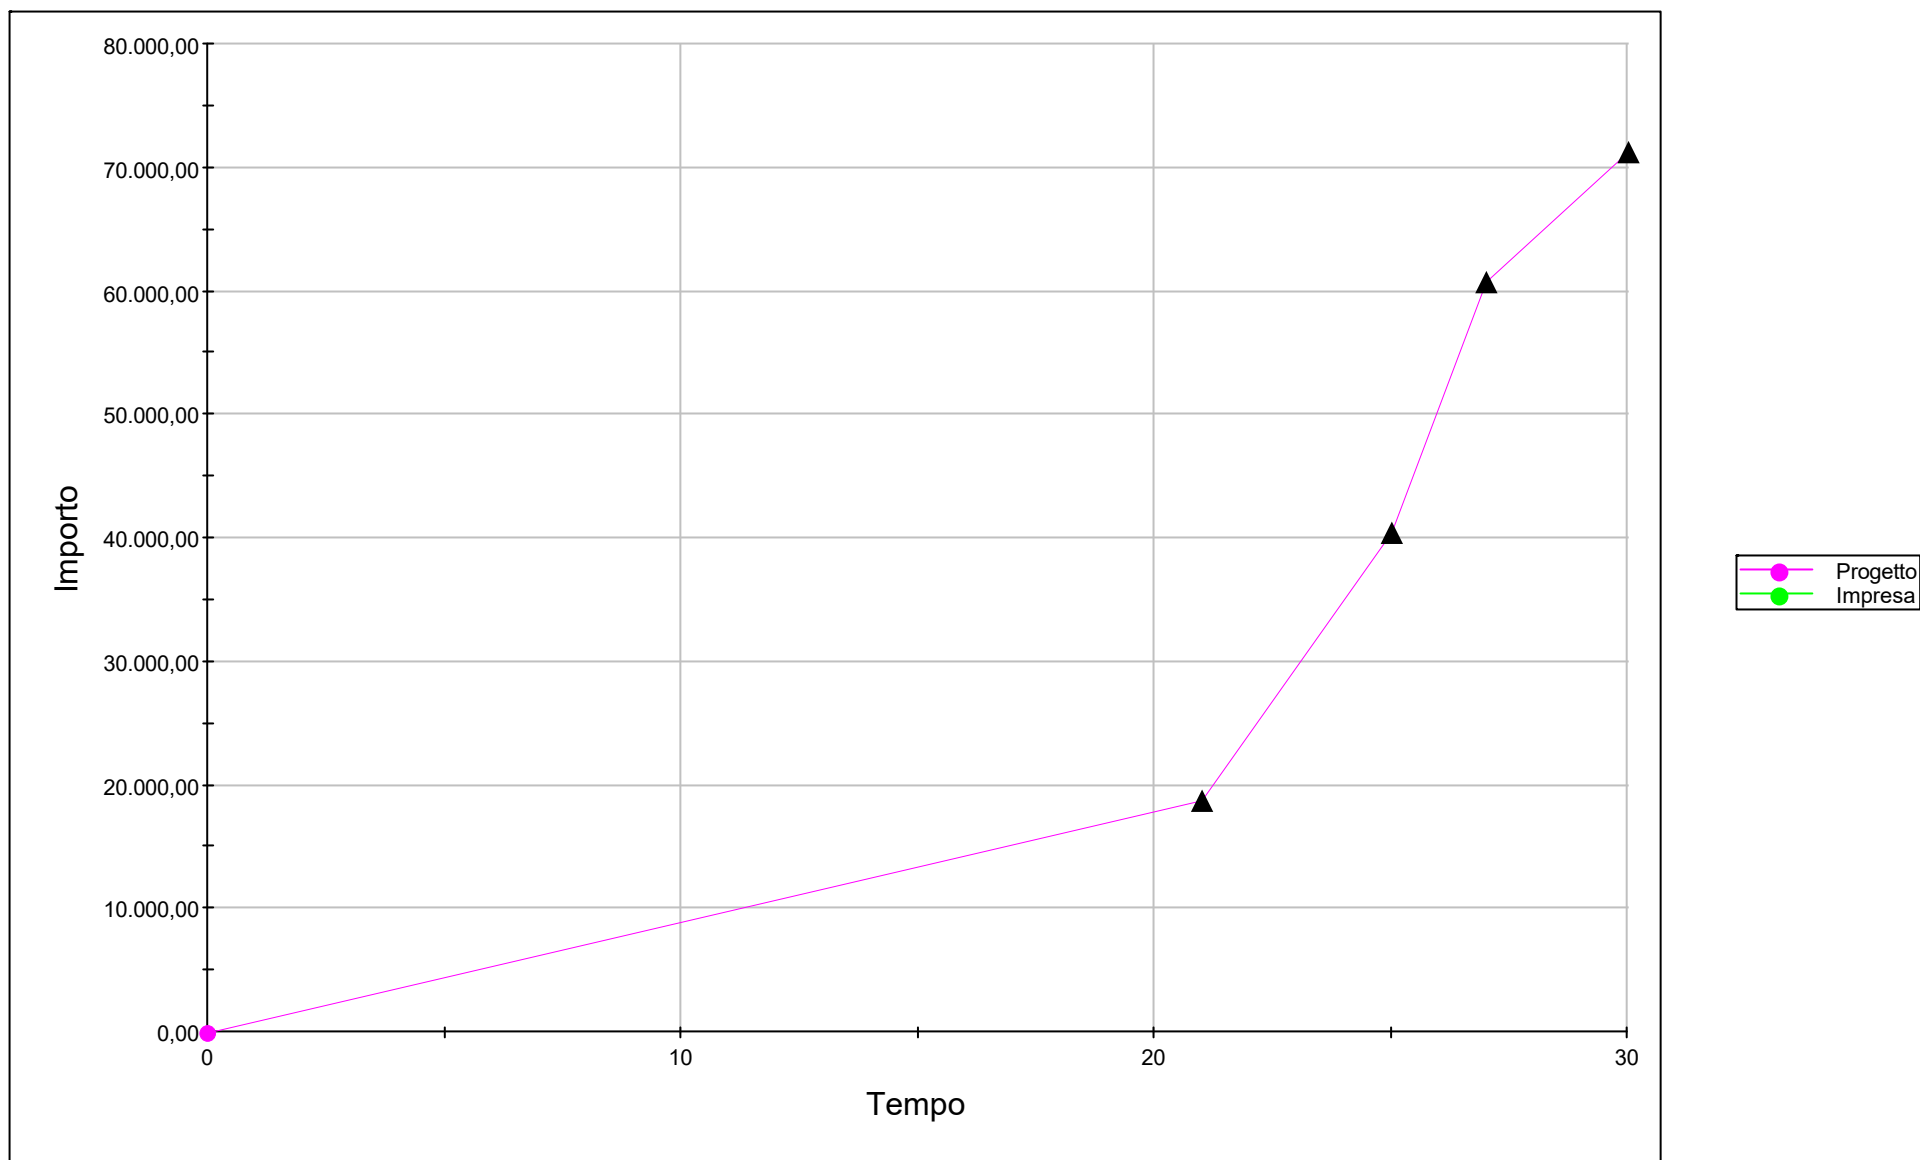

LEGENDA: ■ punto che delimita periodi a media di produzione costante
 ■ Stato Avanzamento Lavori programmato
